

Alarm fra værket – der er brud.....



Hvad kunne der være sket...

- Vandværket var løbet tør for vand i løbet af timer
- Hele udgravningen kunne være ødelagt
- Masser af godt vand var gået til spilde

Det er vigtigt at have overvågning af ledningsnettet....


Ondag den 19.10.2011 kl. 21.22 kom der en besked på mobiltelefonen at vandforbruget pludselig var steget voldsomt.

Efter kontrol af værket via remote-opkobling var vi overbeviste om at der måtte være en kraftig lækage i ledningsnettet.

Mistanken faldt straks på en større udgravning ved Egersund Kirke, som var foretaget af Sønderborg Forsyning i

forbindelse med renoveringer af Kloaker på Sundgade.

Det kunne høres på lang afstand at der plaskede vand i større mængde. Vandledningen var „sprunget“ 3 steder

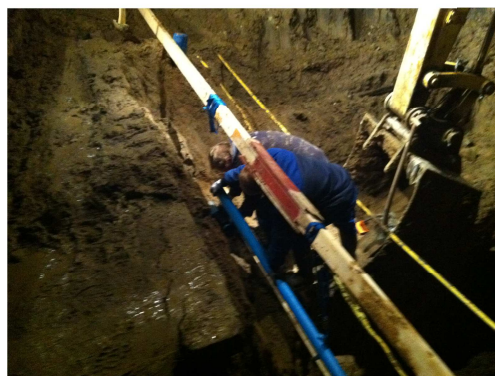

Vi gik straks i gang...

I forbindelse med gravearbejdet havde ledningen været blotlagt, hvilket betød at den kunne skubbe sig fra 3 befæstninger. Dermed fossede der vand ud af 3 hovedledninger – i alt næsten 50.000 liter vand pr. time. Vi måtte hurtigst muligt have lukket for stophanerne og gen-etableret nogle midlertidige ledninger. Kl. 00,30 torsdag morgen var dette arbejde afsluttet og vi kunne igen åbne for vandet.

Stor tak til Egersund VVS for indsatsen.

1. Det er godt at kunne stole på sine håndværkere
2. Det er godt at have en proaktiv overvågning af sit vandværk.



Her ses de reparationer der blev udført, således at Sundgade igen havde vand i hannerne.....
